



003303

'18 APR 19 A9:41

Instituto Tecnológico de Apizaco

OFICIALIA DE PARTES
RECIBIDO

Apizaco, Tlax., 17/abril/2018

OFICIO No.: P-181/2018

**C. LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
P R E S E N T E**

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2016 (ProExOEES) del mes de abril del 2018.

FORMATO: PER-04

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE

Pensar Para Servir, Servir Para Triunfar®



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLOGICO NACIONAL
DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
DIRECCIÓN

**MTRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE,
DIRECTOR**

FPRA/EAN/CAG/srh*

C.C.P.- Archivo

**DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA
DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA**

CONSTRUCCIÓN

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

1
SES Hoja 1 de 1
DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

2 **DATOS DEL TECNOLÓGICO**

NOMBRE INSTITUTO TEC. DE APIZACO PROGRAMA PROEXOES 2016
TNM140723GFA
 UBICACIÓN Carr. Apizaco- Tzompantepec, Esq. Av. Tecnológico S/N Tlaxcala

3 **DATOS DE LA ETAPA**

FECHA DE INICIACIÓN:

26	12	2017
DÍAS	MES	AÑO
26	5	2018

FECHA DE TERMINACIÓN:

26	5	2018
DÍAS	MES	AÑO

4 **DATOS DE REPORTE**

REPORTE No:

4	6
---	---

FECHA:

17	04	2018
DIA	MES	AÑO

5 EDIFICIOS Y LOCALES		6 ESTRUCTURA				7 ACABADOS				8 INSTALACIONES				9 OBRA EXTERIOR			10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS				11 TOTALES	
NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALES QUE CONTIENE	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	5	5	10	30	40	30	100	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORT.
		CIMENTOS	COLUMNAS Y O MUROS	TECHOS Y/O ENTREPISO	TOTAL	PUERTAS VENTANAS Y BARRANDALES	PISOS Y/O APILAMADOS	PINTURA	TOTAL	SANITARIA	HIDRAULIC A Y/O ESR	ELECTRICA	TOTAL	INSTALACIONES	ARRODADORE S PLAZAS Y JARDIN	TOTAL	COMPACTACION	ACABADO FINAL	INSTALACIONES	TOTAL		
δ DELTA	NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO	10	10	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	1	*

12 **RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR**

NOMBRE: ING. MAGALY GARZA ORTEGA

CARGO: ENCARGADA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO

FIRMA

13 **V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO**

NOMBRE: MRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO ASQUIRAI

FIRMA

14 **PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL**

TOTALES				%
EDIFICIOS Y LOCALES				
ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS				

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE : INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
DOMICILIO COMPLETO : CARRETERA APIZACO- TZOMPANTEPEC ESQ. AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO
 S/N CONURBADO APIZACO- TZOMPANTEPEC, TLAXCALA MÉXICO C.P. 90300

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO : 26 / 12 / 2017
 DÍA MES AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN : 26 / 5 / 2018
 DÍA MES AÑO

FECHA DEL REPORTE

FECHA : 17 / 4 / 2018
 DÍA MES AÑO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEXOES 2016	NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO	10,400,000.00		10,400,000.00	\$9,579,240.77	38%	3,640,111.49	4,444		25%	Fabricación de zapatas corridas reforzadas con contratabres de concreto armado. Fabricación de dados de cimentación. Anclaje de columnas de concreto armado. Inicio de rellenos compactados

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
NOMBRE : ING. MAGALY GARZA ORTEGA
CARGO : ENCARGADA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
CORREO ELECTRONICO : mgarza@outlook.com
TEL 10 DIGITOS : 241 41 7 20 10

FIRMA



NOMBRE : VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO
 MTR. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE

FIRMA




SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DIRECCIÓN

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PROEXOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
DOMICILIO COMPLETO CARRETERA APIZACO- TZOMPANTEPEC ESQ. AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO
S/N CONURBADO APIZACO- TZOMPANTEPEC, TLAXCALA MÉXICO C.P. 90300

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO

26	12	2017
DÍA	MES	AÑO

FECHA DE TERMINACIÓN

26	5	2018
DÍA	MES	AÑO

FECHA DEL REPORTE

FECHA

17	4	2018
DÍA	MES	AÑO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/ O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEXOES 2016	NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO	10,400,000.00		10,400,000.00	\$9,579,240.77	38%	3,640,111.49	4,444		25%	Fabricación de zapatas corridas reforzadas con contratraves de concreto armado. Fabricación de dados de cimentación. Anclaje de columnas de concreto armado. Inicio de rellenos compactados

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : ING. MAGALY GARZA ORTEGA
CARGO : ENCARGADA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
CORREO ELECTRONICO: magarza@outlook.com
TEL 10 DIGITOS : 241 41 7 20 10

FIRMA



NOMBRE :

VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

MTRD. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE

FIRMA




SELO OFICIAL
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 TECNOLÓGICO NACIONAL
 DE MÉXICO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
DIRECCIÓN

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PROEXOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

**DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA
DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA**

CONSTRUCCIÓN

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

1
SES Hoja 1 de 1
DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

2 **DATOS DEL TECNOLÓGICO**

NOMBRE INSTITUTO TEC. DE APIZACO PROGRAMA PROEXOES 2016
TNM140723GFA
 UBICACIÓN Carr. Apizaco- Tzompantepec, Esq. Av. Tecnológico S/N Tlaxcala

3 **DATOS DE LA ETAPA**

FECHA DE INICIACIÓN :

26	12	2017
DÍAS	MES	AÑO

 FECHA DE TERMINACIÓN :

26	5	2018
DÍAS	MES	AÑO

4 **DATOS DE REPORTE**

REPORTE No :

4	6
---	---


 FECHA :

17	04	2018
DIA	MES	AÑO

5 EDIFICIOS Y LOCALES		6 ESTRUCTURA				7 ACABADOS				8 INSTALACIONES				9 OBRA EXTERIOR			10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS				11 TOTALES	
NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALES QUE CONTIENE	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	5	5	10	30	40	30	100	EDIFICIOS	ZONAS
		CIMENTOS	COLUMNAS Y MUROS	TECHOS Y/O ENTREPISO	TOTAL	PUERTAS VENTANAS Y BARRANDALES	PISOS Y/O APLAJADOS	PINTURA	TOTAL	SANITARIA	HIDRAULICA Y/O ESR	ELECTRICA	TOTAL	INSTALACIONES	ANDADORES Y PLAZAS Y JARDIN	TOTAL	COMPACTACION	ACABADO FINAL	INSTALACIONES	TOTAL	Y LOCALES	DEPORT.
δ DELTA	NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO	10	10	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	*	*	*	1	*

12 **RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR**

NOMBRE : ING. MAGALY GARZA ORTEGA
 CARGO : ENCARGADA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO


FIRMA

13 **V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO**

NOMBRE : MRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE


FIRMA

14 **PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL**


TOTALES				%
EDIFICIOS Y LOCALES				
ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS				

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

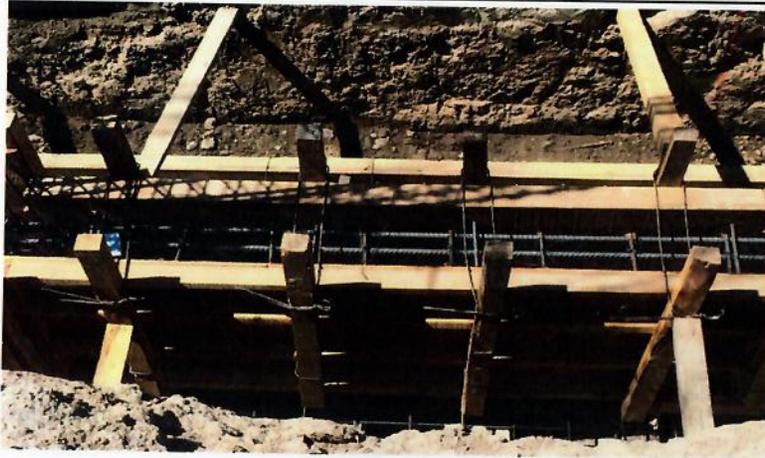

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO
