



"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Apizaco, Tlax., **07/MARZO/2017**

DEPENDENCIA: I.T.A.
DEPTO.: PLANEAC., PROG. Y P.
OFICIO No.: P-062/2017

C. LIC. BLANCA GLORIA MORENO PEREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
PRESENTE

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) correspondiente al año 2015.

FORMATO: PER-04

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE

Pensar Para Servir, Servir Para Triunfar®

MTR. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE.
DIRECTOR

FPRA/JMC/CAG/ihc*



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
DIRECCIÓN

REPORTE DE AVANCE DE OBRA SEGÚN CONTRATO

2017

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO 28DTT0037U
 DOMICILIO COMPLETO: Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N
 Comandado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Méx.

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE

FECHA DE INICIO: 11 4 16
 FECHA DE TERMINACIÓN: 13 11 16
 DIA MES AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				

FAM 2015	EDIFICIO DEL CENTRO DE IDIOMAS	22,165,000.00 Construcción 4,011,715.00 Equipamiento	0.00	26,176,715.00	\$ 19,921,162.53	100%	\$ 21,921,262.53	3188	3696	100%	
----------	--------------------------------	---	------	---------------	------------------	------	------------------	------	------	------	--

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: M.E.M. IVÁN HERNÁNDEZ CÁRRASCO

CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO
 CORREO ELECTRONICO: herandezia@idbnetmail.com
 TEL. 10 DIGITOS: 241 41 7 2010 ext 140

VOBO DIRECTOR DEL INSTITUTO: [NOMBRE: MTR. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE]

FIRMA: [FIRMA]

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MINIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
 DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE MÉXICO
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO
 DIRECCIÓN



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA
COORDINACION DE PLANEACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA
DIRECCION DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIÓN

CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

SES Hoja 1 de 1
 DIRECCION GENERAL DE
 EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA

2 DATOS DEL TECNOLÓGICO

NOMBRE INSTITUTO TEC. DE APIZACO
 UBICACIÓN AV. INS. TEC. S/N APIZACO, TLAX
 PROGRAMA FAM 2015

3 DATOS DE LA ETAPA

FECHA DE INICIACIÓN:
 FECHA DE TERMINACIÓN:

4 DATOS DE REPORTE

REPORTE No:
 FECHA:

5	EDIFICIOS Y LOCALES	6 ESTRUCTURA			7 ACABADOS			8 INSTALACIONES			9 OBRA EXTERIOR			10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS			11 TOTALES			
		NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALES QUE CONTIENE	10	10	30	10	10	30	10	10	30	5	5	10	30		40	30	100
α	CENTRO DE IDIOMAS	10	10	30	10	10	30	10	10	30	5	5	10	*	*	*	*	1	*	


12 RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR
 NOMBRE: M.E.M. IVAN HERNANDEZ CARRASCO
 CARGO: JEFE DE LA OFICINA DE CONSTRUCCION Y EQUIP FIRMA

13 NOMBRE: V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO
 MTR. FELIPE PASOJUAL ROSARIO AGUIRRE
 FIRMA

14 PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

TOTALES	%
EDIFICIOS Y LOCALES	
ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS	



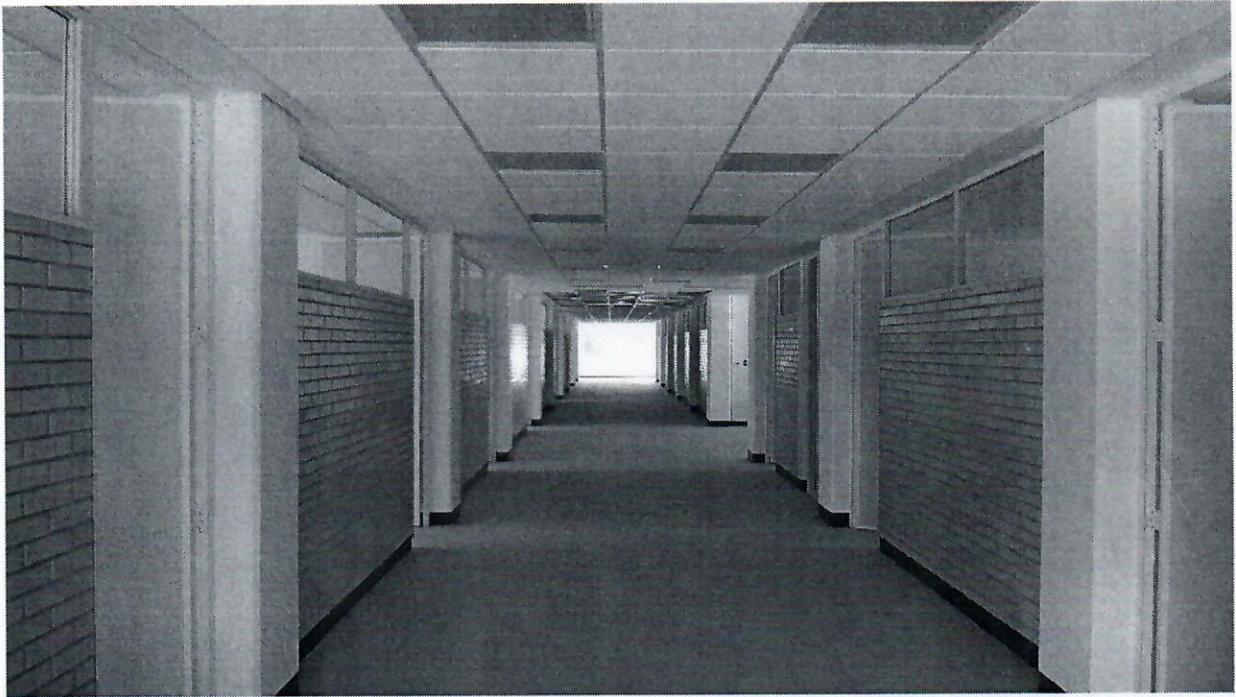

~~2~~

