



Instituto Tecnológico de Apizaco

Apizaco, Tlaxcala, **08/octubre/2021**

NO. DE OFICIO: PPP-144/2021

ASUNTO: Reporte de Avance de obra mes de agosto 2021

BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
PRESENTE

Por este medio me permito saludarla cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Escuelas al CIEN 2017, del edificio denominado Laboratorio de Autotrónica, de acuerdo con el Reporte Físico-Financiero emitido por el órgano constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) del mes de agosto de 2021 y que se adjunta al presente.

Agradeciendo de antemano su atención al presente, me despido reiterándole mi agradecimiento y alta consideración.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*

P.A.

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR.



ccp. Archivo

SORA/JCMC/cag



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N, Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P.90300
Tel. (241) 4172010 ext. 140, e-mail: pl_apizaco@tecnm.mx

tecnm.mx | apizaco.tecnm.mx



7	enero	2019
DÍA	MES	AÑO

8	octubre	2021
DÍA	MES	AÑO



REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA

2021

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			CONTRATO			ORGANO CONSTRUCTOR		FECHA Y NÚMERO DE ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN Y/O FINIQUITO	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	NÚMERO	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCER DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO (%)		
ESCUELAS AL CIEN 2017	UNIDAD MULTIFUNCCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTÓNICA)	\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00	EACSUP-29-094-2018	\$ 16,007,790.06	\$ 11,430,552.28	\$ 4,577,237.78	71%	86%	REPORTE DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE ACOSTO 2021
									0%	0%	
									0%	0%	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, QUE EN SU CASO INCLUYA EL REINTEGRO DE ESTOS A LA TESORO (ESTADO BANCAARIO QUE REFLEJE EL DEPÓSITO, LINEA DE CAPTURA, ESTADO DE CUENTA)

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN


NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZALEZ
CARGO: JEFA DEL DEPTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
CORREO OFICIAL: PLANZAC@EDUCACION.MEX
TEL Y/O DIGITOS: 244172010
FIRMA:

AUTORIZO DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIRRE
FIRMA:

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCAARIO QUE CONSIGNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONTEMPLADO.





PROXIMOS (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSION EN LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR; VERSIONES 2014, 2015 Y 2016)
FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2014-2019)
ESCUELAS AL CIEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL EDUCATIVA 2015-2018)



REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2021

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	
 Habilitación de sanitarios		 Colocación de pisos y aplamado de muros interiores y exteriores	 Colocación de trabajos metálicas para techumbre
META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) ESCUELAS AL CIEN 2017	META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) PROGRAMA Y AÑO: ESCUELAS AL CIEN 2017	META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) PROGRAMA Y AÑO: ESCUELAS AL CIEN 2017	META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) PROGRAMA Y AÑO: ESCUELAS AL CIEN 2017

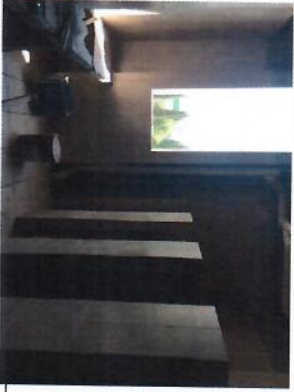SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	
 Colocación de pisos y aplamado de muros interiores y exteriores	 Colocación vidrios y aplamado de muros interiores y exteriores	 Habilitación de sanitarios	
META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) ESCUELAS AL CIEN 2017	META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) PROGRAMA Y AÑO: ESCUELAS AL CIEN 2017	META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) PROGRAMA Y AÑO: ESCUELAS AL CIEN 2017	META Y/O PROYECTO: UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) PROGRAMA Y AÑO: ESCUELAS AL CIEN 2017

FECHA DE CORTE: 31 de agosto de 2021

Nombre de la Obra	Contrato	Código	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Avance Fisico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO "Z-A" UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS 11 E.E. ESTRUCTURA AISLADA Y OBRA EXTERIOR	EACOSUP-29-094-2018	E-AL-C-SUP-05-2018	\$ 16,007,790.06	PROVICONSA, S.A. DE C.V.	\$ 11,430,552.28	4,577,237.78	86%	71%	OBRA EN PROCESO


ITIFE
 INSTITUTO TIXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION


ITIFE
 INSTITUTO TIXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 DEPARTAMENTO ADMINISTRACION


ITIFE
 INSTITUTO TIXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 DIRECCION GENERAL





TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

Clave: FT- DA-06-00.

Oficio Núm. ITIFE/DG/JDA/0140/2021.

Tlaxcala, Tlax., a 29 de septiembre de 2021.

Asunto: Avance físico-financiero.

**MAESTRO SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO.
DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO.
P R E S E N T E.**

En atención a su oficio número PPP-131/2021, donde solicitó avance físico y financiero de los meses de junio, julio y agosto de 2021 de la siguiente obra:

- Unidad multifuncional de talleres y laboratorios de autotrónica, con número de contrato EACSUP-29-094-2018, con recursos del programa "Escuelas al cien 2017".

Al respecto, anexo al presente los avances de dicha obra.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN GENERAL
LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
**DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

C.c.p. Archivo
JFH/toc
Folio 1546



Instituto Tecnológico de Apizaco

Apizaco, Tlaxcala, 09/septiembre/2021

No. de oficio: PPP-131/2021

ASUNTO: Solicitud de informe físico-financiero

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PRESENTE

Sirva el presente para saludarle y al mismo tiempo en alcance a mi oficio no. PPP-122-2021 de fecha 17 de agosto del 2021, me permito solicitar a usted de la manera más atenta, remita los Informes Físico Financiero de los meses de junio, julio y agosto del 2021 en lo referente al Edificio "Z-A" Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios II E.E., estructura aislada y obra exterior denominado Laboratorio de Autotrónica del programa Escuelas al CIEN 2017, con número de contrato EACSUP-29-094-2018.

Así mismo, solicito de la manera más atenta nos anexe el estado de cuenta bancario actualizado del programa arriba mencionado.


Agradeciendo de antemano su atención al presente, me despido reiterándole mi agradecimiento y alta consideración.

ATENTAMENTE
Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®

SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR

ccp. Archivo

SORA/JCMC/dag



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N, Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P.90300
Tel. (241) 4172010 ext. 140, e-mail: pl_apizaco@tecnm.mx

tecnm.mx | apizaco.tecnm.mx

