

Instituto Tecnológico de Apizaco
Planeación, Programación y Presupuestación

Apizaco, Tlaxcala, **22/noviembre/2022**

OFICIO No. PPP-271/2022

ASUNTO: REPORTE CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE.

BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN
E INFRAESTRUCTUR FÍSICA DEL TECN.
P R E S E N T E

Sirva el presente para saludarle cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra denominado: "Unidad Multifuncional de Talleres y Laboratorios Edificio de Autotrónica, del programa "Escuelas al CIEN 2017", de acuerdo al Reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), mismo que se adjunta al presente.

Agradeciendo de antemano su atención al presente, me despido reiterándole mi agradecimiento y alta consideración.

ATENTAMENTE

*Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®*



SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR.



ccp. Archivo
SORA /JCMC/CAG/srh



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N,
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90491 Tel. (241) 4172010 Ext. 144,
e-mail: planeacion@apizaco.tecnm.mx technm.mx | apizaco.tecnm.mx



CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO	7	ENERO	2019
DÍA	MES	AÑO	
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	25	AGOSTO	2019
DÍA	MES	AÑO	

FECHA DEL REPORTE	30	SEPTIEMBRE	2022
DÍA	MES	AÑO	



2022

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO		NÚMERO	CONTRATO		ÓRGANO CONSTRUCTOR		FECHA Y NÚMERO DE ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÓN Y/O FINIQUITO	OBSERVACIONES	
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCICIO DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCER DEL CONTRATO			AVANCE FINANCIERO (%)
ESCUELAS AL CIEN 2017	UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA)	\$ 30,000,000.00	\$	\$ 30,000,000.00	EACSUP-29-094-2018	\$ 16,007,790.06	\$ 13,586,996.27	\$ 2,420,793.79	85%	94%	REPORTE DE AVANCE DE OBRA AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022
									0%	0%	
									0%	0%	

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, QUE EN SU CASO INCLUYA EL REINTEGRO DE ESTOS A LA TESOFERÍA (ESTADO BANCARIO QUE REFLEJE EL DEPÓSITO, LINEA DE CAPTURA, ESTADO DE CUENTA)

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN


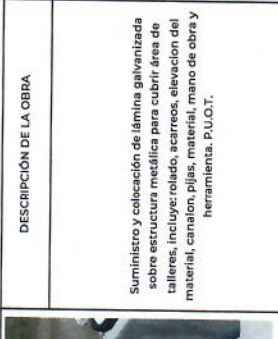

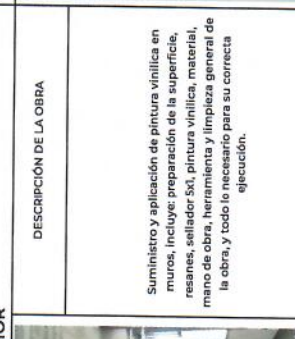
NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZALEZ
 CARGO: JEFA DEL DEPTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
 CORREO OFICIAL: carolina.gonzalez@itec.mx
 TEL 10 DÍGITOS: 241472010
 FIRMA:

AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIAYO
 FIRMA:



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Suministro y colocación de lámina galvanizada sobre estructura metálica para cubrir área de talleres, incluye: rolado, acarreo, elevación del material, canalón, pilas, material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T.</p>		<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Suministro y colocación de lámina galvanizada sobre estructura metálica para cubrir área de talleres, incluye: rolado, acarreo, elevación del material, canalón, pilas, material, mano de obra y herramienta. P.U.O.T.</p>
<p>META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:</p> <p>UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNIC. ESUELAS AL CIEN 2017</p>	<p>META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:</p> <p>UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) ESUELAS AL CIEN 2017</p>		
SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
	<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros, incluye: preparación de la superficie, resanes, sellador Sxi, pintura vinílica, material, mano de obra, herramienta y limpieza general de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>		<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros, incluye: preparación de la superficie, resanes, sellador Sxi, pintura vinílica, material, mano de obra, herramienta y limpieza general de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución. En relación de este concepto, se encuentra ejecutado y terminado al 100%.</p>
<p>META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:</p> <p>UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNIC. ESUELAS AL CIEN 2017</p>	<p>META Y/O PROYECTO: PROGRAMA Y AÑO:</p> <p>UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS (LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA) ESUELAS AL CIEN 2017</p>		

Handwritten signature or initials in blue ink.

FECHA DE CORTE: 30 de septiembre de 2022

Nombre de la Obra	Contrato	Código	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Avance Físico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO "Z-A" UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS 11 E.E. ESTRUCTURA AISLADA Y OBRA EXTERIOR	EACSUP-29-094-2018	E-AL-C-SUP-05-2018	\$ 16,007,790.06	PROVICONSA, S.A. DE C.V.	\$ 13,588,996.27	2,420,793.79	94%	85%	OBRA EN PROCESO

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**
Jefa del Departamento de Construcción

C. P. *[Firma]* Hernández

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

Lic. Miguel Piedras Díaz
Director General
ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

[Firma]
