

ACUSE



25 ENE 2019

Apizaco, Tlax., 15/ENERO/2019

RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.
OFICIO No.: P-033/2019

ASUNTO: REPORTE

000998

LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
PRESENTE

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Avance Físico-Financiero del Programa Escuelas al CIEN 2017, denominado Laboratorio de Autotrónica.

*Adjunto documentación

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE
Excelencia en Educación Tecnológica®
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®

[Handwritten signature of Mtro. Felipe Pascual Rosario Aguirre]

MTRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
DIRECTOR



Archivo
FPRA/EAN/CAG/srh



REPORTE DE AVANCE DE OBRA

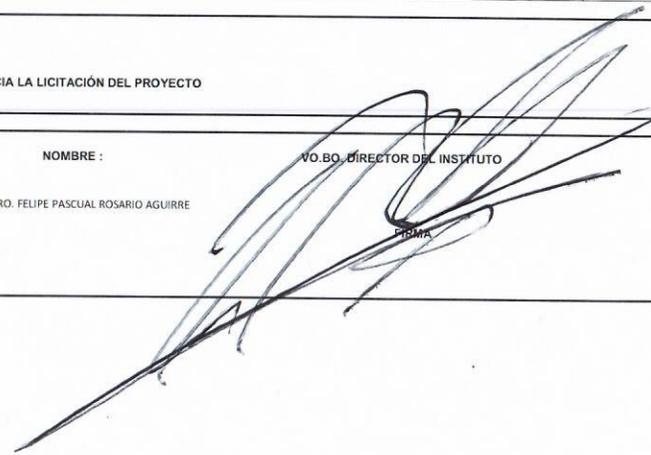
DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO **2019**

NOMBRE <u>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO</u> DOMICILIO COMPLETO <u>CARRETERA APIZACO- TZOMPANTEPEC ESQ. AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO</u> <u>S/IN CONURBADO APIZACO- TZOMPANTEPEC, TLAXCALA MÉXICO C.P. 90300</u>	CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DE INICIO <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>7</td><td>1</td><td>2019</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table> FECHA DE TERMINACIÓN <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>25</td><td>8</td><td>2019</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>	7	1	2019	DÍA	MES	AÑO	25	8	2019	DÍA	MES	AÑO	FECHA DEL REPORTE FECHA <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>14</td><td>1</td><td>2019</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>	14	1	2019	DÍA	MES	AÑO	TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL</small> <small>DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA</small> <small>ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO</small>
7	1	2019																			
DÍA	MES	AÑO																			
25	8	2019																			
DÍA	MES	AÑO																			
14	1	2019																			
DÍA	MES	AÑO																			

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/ O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL			\$				
PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN 2017	LABORATORIO DE AUTOTRÓNICA	30,000,000.00		30,000,000.00							ACTA DE FALLO, LICITACIÓN PÚBLICA Y AVISO DE INICIO DE OBRA

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

AÚN NO SE INICIA LA LICITACIÓN DEL PROYECTO

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE : <u>ING. MAGALY GARZA ORTEGA</u> CARGO : <u>ENCARGADA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO</u> CORREO ELECTRONICO: <u>pl_apizaco@tecnm.mx</u> TEL 10 DIGITOS : <u>241 41 7 20 10 ext. 140</u>	FIRMA 	NOMBRE : <u>VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO</u> MTRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE FIRMA 	 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO DIRECCIÓN <small>SELLO OFICIAL</small>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
