



**SEP**

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SEP  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
ORH CIA

19 MAR 20 11:18

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

OPORTUNIDADES PARTES  
C I D O



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Apizaco

**003591**

Apizaco, Tlax., **12/MARZO/2019**

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.  
OFICIO No.: P-137/2019

ASUNTO: REPORTE DE AVANCE DE OBRA

**LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ  
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL  
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.  
P R E S E N T E**

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Escuelas al CIEN 2017, del edificio denominado Autotrónica, de acuerdo al reporte Físico-Financiero emitido por el Órgano Constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), mismo que se adjunta al presente y que corresponde al mes de febrero.

Sin más por el momento, me despido de usted.

**ATENTAMENTE**

Excelencia en Educación Tecnológica®  
Pensar para Servir, Servir para Triunfar®

**MIRÓ, FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE  
DIRECTOR**



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
TECNOLÓGICO NACIONAL  
DE MÉXICO  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO  
**DIRECCIÓN**

Archivo  
FPRA/EAN/CAG/srh



Carretera Apizaco-Tzompantepec, esquina con Av. Instituto Tecnológico S/N  
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Mex. C.P. 90300  
Tel. 01 (241) 4172010, Ext. 140 e-mail: planeacion@apizaco.tecnm.mx  
www.tecnm.mx | www.apizaco.tecnm.mx







REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APAZCO  
 DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA APAZCO- TZOMPANTEPEC ESQ. AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO SIN CONJURADO APAZCO- TZOMPANTEPEC, TLAXCALA MÉXICO C.P. 90900

CALENDARIO DE OBRA, SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DE INICIO: 7 1 2019  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 25 8 2019

FECHA DEL REPORTE

FECHA: 12 3 2019  
 DIA MES AÑO

2019

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO DEL  
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO  
 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA, INVESTIGACIÓN E  
 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL						
PROGRAMA ESTADUAL CEN 2017	UNIDAD MULTIFUNCIÓNAL DE TALLERES Y LABORATORIOS ( LABORATORIO DE AUTOMÁTICA	30,000,000.00		30,000,000.00	\$16,007,790.06	0%	4,628		8%	EXCAVACION DEL AREA

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

AUN NO SE INICIA LA LICITACION DEL PROYECTO

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

NOMBRE: ING. MAGALY GARCIA ORTEGA  
 CARGO: JEFA DE LA OFICINA DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO  
 CORREO ELECTRONICO: ELACOROS@icmeximex.mx  
 TEL. 10 DIGITOS: 241 417 20 10 ext. 140

NOMBRE:

MTRD. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE


VOLVO DIRECTOR DEL INSTITUTO

FIRMA

SELLO OFICIAL

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

**2019**  
**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**  
SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL  
SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA  
DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

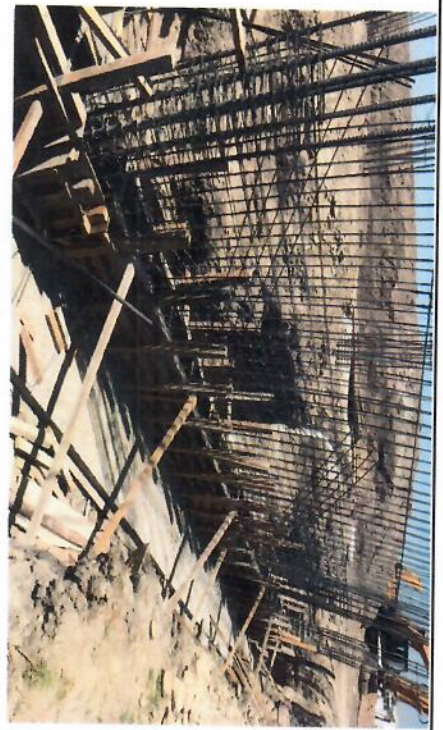

UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA



UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
