

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

015421

Acuse



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

CIA
11 DIC 2018

RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES

Instituto Tecnológico de Apizaco

Apizaco, Tlax., 04/DICIEMBRE/2018

DEPTO.: PLAN. PROG. Y PRESUP.
OFICIO No.: P-893/2018

**ASUNTO: REPORTE DE AVANCE DE OBRA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.**

**LIC. BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
P R E S E N T E**

Sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa de Expansión de la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior 2016 (ProExOEEES).

Sin más por el momento, me despido de usted.

ATENTAMENTE

EXCELENCIA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
PENSAR PARA SERVIR, SERVIR PARA TRIUNFAR®

**MTRO. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
DIRECTOR**



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DIRECCIÓN

FPRA/EMN/CAG/MGO/srh



Carretera Apizaco-Tzompantepec, Esq. con Av. Instituto Tecnológico S/N
Conurbado Apizaco-Tzompantepec, Tlaxcala, Méx.
C.P. 90300, Apizaco, Tlax. Tels. 01241 4172010, Ext. 140, e-mail: planeacion@apizaco.tecnm.mx,
www.apizaco.tecnm.mx



REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APZACCO
 DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA APZACCO-TZOMPANTEPEC ESQ. AV. INSTITUTO TECNOLÓGICO
 SIN CONJURBADO APZACCO-TZOMPANTEPEC, TLAXCALA MÉXICO C.P. 90390

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA
 FECHA DE INICIO: 26/12/2017
 FECHA DE TERMINACIÓN: 09/10/2018

FECHA DEL REPORTE: 4/12/2018
 FECHA: 4/12/2018

2018
 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
 SECRETARÍA DE FINANCIACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROXEOESS 2016	NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO	10,400,000.00		10,400,000.00	\$9,579,240.77	87%	8,333,839.47	4,244		100%	Se adjunta Acta Entrega- Recepción de Obra, y último Informe Físico-Financiero firmado y emitido por el Origen Constructor TFFE

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACION
 NOMBRE: M. A. CARRILINA ANICÓ GONZÁLEZ
 CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
 CORREO ELECTRONICO: carri@itec.mx
 TEL. 10 DIGITOS: 241 41 720 10 ext. 140

NOMBRE: VO. BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO
 MTR. FELIPE PASCUAL ROSARIO AGUIRRE
 FIRMA: 



ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO
 EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO
 FAM. (FONDO DE APORTACIONES MILITARES 2012 A 2017)
 PADE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PROXEO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014, 2015 Y 2016))
 DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.
 PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)
 AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

2018


ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO

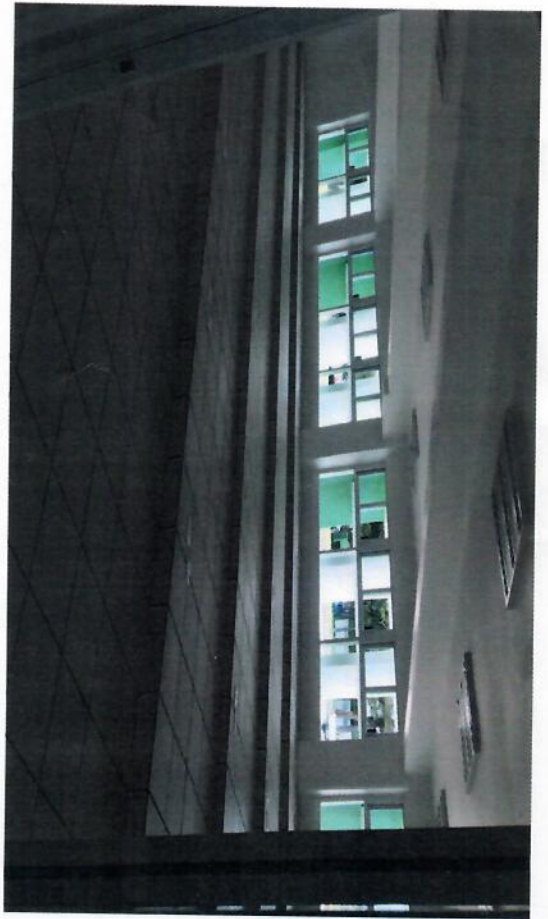

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO
